


Avviato il recupero del cornicione e delle coperture della Chiesa di Casalcermelli

scritto da Arch. Antonella B. Caldini | 15 Ottobre 2025

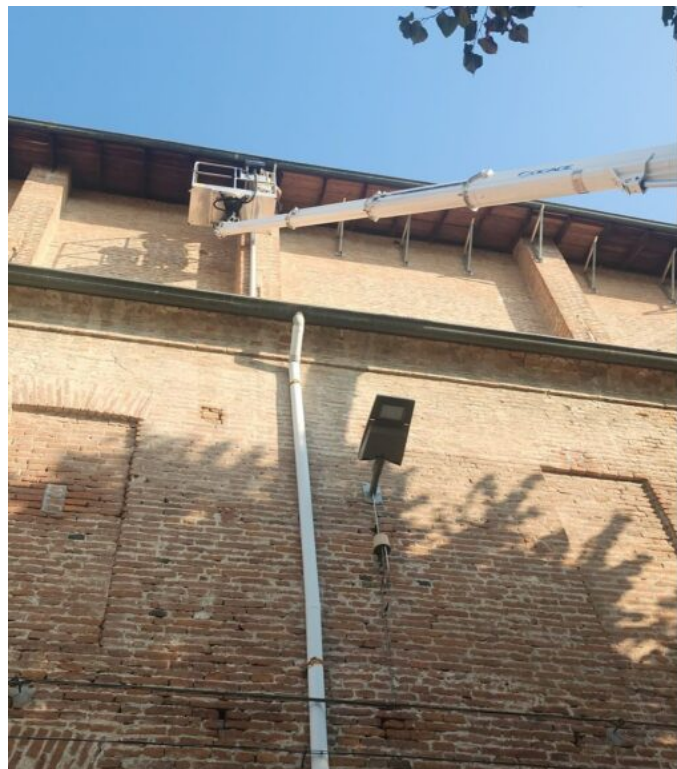

Chiesa Parrocchiale della Beata Vergine Assunta a Casalcermelli (AL)

Partiti i lavori di risanamento conservativo del cornicione del campanile (prospetto sud) e di revisione generale delle coperture



WWW.RESTAUROECONSERVAZIONE.INFO

In data **13 ottobre** ha avuto luogo l'**avvio ufficiale delle operazioni di cantierizzazione** presso la Chiesa Parrocchiale della Beata Vergine, sita nel comune di Casalcermelli.

L'intervento è specificamente finalizzato al **risanamento conservativo** del cornicione (sul prospetto sud) e al **recupero integrale delle coperture**, che coinvolgono sia il corpo principale dell'edificio ecclesiastico sia il campanile adiacente.

Il finanziamento di tali opere è assicurato attraverso il **contributo della Conferenza Episcopale Italiana (CEI)**, erogato tramite i fondi dell'8 per mille destinati a interventi su beni culturali ecclesiastici, e attraverso specifici **contributi del Ministero della Cultura** per opere di conservazione su beni sottoposti a vincolo di tutela.

L'esecuzione dei lavori è stata affidata all'**Impresa Cavallo Costruzioni** di Alessandria. La **Direzione Lavori (DL)** è assunta dalla sottoscritta professionista.



Data la necessità di **operare in quota** sulle coperture dell'edificio ecclesiale e della torre campanaria, la fase iniziale di cantierizzazione ha contemplato prioritariamente l'**installazione di protezioni collettive (PCG)**.

Tali protezioni, costituenti i **parapetti provvisori** anticaduta, sono essenziali per la messa in sicurezza dei lavoratori, in conformità con la normativa vigente in materia di **salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** (D. Lgs. 81/08). L'entità dimensionale del manufatto richiede una programmazione di diversi giorni per il completamento delle procedure di messa in sicurezza.

Parallelamente, nell'area del cortile interno, è stato allestito il **campo base di cantiere**. Quest'area funzionale include i **baraccamenti** (unità logistiche per il personale) e una specifica **zona di stoccaggio** per i materiali e le attrezzature, delimitata da apposite **recinzioni e reti di protezione**, in coerenza con il *Lay-out di Cantiere* previsto.

L'organizzazione logistica è completata dall'installazione del **cartellone di cantiere**, realizzato in conformità al *layout* prescritto dalla CEI.



Continueremo a tenervi aggiornati sull'avanzamento dei lavori in questo importante cantiere di restauro. Rimanete connessi!!
